


【공정관리 출제문제】

다음 데이터를 보고 표준 네트워크공정표를 작성하고, 7일 공기단축한 상태의 네트워크공정표 및 추가비용의 최소치를 계산하시오. (10점)

작업명	작업일수	선행작업	비용구배(천원)	비고
A	2	없음	50	공기단축은 각 작업일수의 1/2을 초과할 수 없다.
B	3	없음	40	
C	4	없음	30	
D	5	A,B,C	20	
E	6	A,B,C	10	
F	4	B,C	15	
G	3	C	23	
H	6	D,F	37	
I	7	E,G	45	

(1) 표준 네트워크공정표

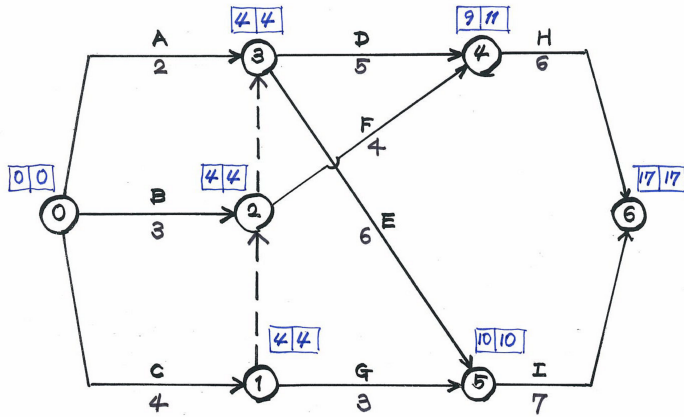

(2) 7일 공기단축한 네트워크공정표

<답안 수정>

